

會議記錄

大陸毅豐機械手臂專案進度檢討

會議日期	2026 年 5 月 8 日 (五)	會議地點	2F 會議室
主辦單位	毅豐 (台灣)	記錄人員	余振中
出席 - 毅豐	張君豪經理、黃國棟、余振中	出席 - 起達	陳總
出席 - 蘇州 毅豐	邱奕國特助、呂課長		

一、起達進度報告

起達彙報目前進與問題如下：

項目	現況進度	說明
磐石驗機日期延後	原定 4/1 驗機，實際驗機 4/17 完成	原定提早至 4/1 排程驗機，因 12 月下訂單以及年初多次連假，磐石仍無法提早時程，最終時程定於 4/15 驗機，實際驗機 4/17
磐石設備移機與水平定位	4/23 移機，4/24 完成裝機與水平定位	磐石 4/23 移機進廠，至 4/24 完成裝機與定位及水平校正
磐石設備水平校正未達標	起達需耗時 7-10 天校正軌道的水平高度	因磐石設備最終水平校正過高無法降至標準高度，導致起達須重新調整已完成水平校正的軌道
整體進度落差	較原定延後約一個月	因磐石進度延後及設備水平問題導致與原訂時程延後一個月
試運轉排程延後	原定 6/9 → 順延至 7/9	起達進度可能延後至一個月

二、討論事項

(一) 蘇州廠地板平整度與設備入場規劃

- 蘇州新廠一樓地板預計 7 月底完工；管線、電力及各分電盤均已就緒，地板為最後一步。

- **地板完工後必辦：**需要求建商量測機械手臂整個安裝區塊的最高點與最低點落差及位置，定出設備定位基準線。
- **參考台灣現場：**整區最高最低落差約 4 公分，起達設備正負 5 公分微調空間足以應對。
- **入場順序規劃：**需事先規劃每台設備的擺放位置與進場順序動線，確保後入場設備不被先入場設備阻擋。水平、軌道調好後不可移動，事前規劃至關重要。
- **台灣案教訓：**磐石未事先勘查現場地面水平高低落差，設備進場後腳座調至最低仍降不到要求高度，須重新調整已完成水平的軌道，累計延誤半個月。

(二) 蘇州廠磐石相關事項

- **磐石水平定位：**搬運工負責挪移機台；磐石人員到場、自備校正設備，自行進行水平調整（磐石顏總事前承諾 20260121 會議紀錄）。
- **驗機整改進度：**尚有五項未完成；主要待辦：軟體優化有四項、加裝膨脹螺絲腳座與換模側加裝履帶護板（會後磐石告知將於 5/18 至毅豐完成以上軟體優化與硬體加裝）。台灣廠復驗確認後同步至蘇州安徽磐石。
- **電壓規格：**機械手臂 220V；磐石加硫機 380V。已購雙向變壓器，隨第一套設備送往蘇州。
- **測溫棒規格：**由磐石提供，每台加硫機附 4 支；直徑、長度統一固定。模具打孔規格依此配合；後續備品維持同一規格採購。

(三) 治具 (L 型擺料輔具)

- 機械手臂對膠料排放整齊度要求高，台灣已製作 L 型對齊排料治具 2 組供蘇州使用，協助將膠料精準排列於取料位置。
- 排料鋁板治具將由起達負責製作（共 8 塊）。

(四) 防黏片規格確認

- 堆疊膠料所需防黏片尺寸大於 430mm，規格為 450*450*0.75mm。（防黏片規格參見附件一）

(五) 舊模具選用標準與填孔位置標示

- **選模具原則：**四邊（前後左右）有填孔的模具不宜使用（示意圖參見附件二黃色標示區域）；機械手臂拉取時，拉力集中於填孔處，容易從該點撕破製品。
- **填孔規範：**若填孔不可避免，須以「塞平至與模面完全齊平」方式修補。

(六) 機械手臂上模殘膠問題

- **問題說明：**模具前端邊框改至上模後，切嘴部分填平（加壓條），上模蓋邊框區無電鍍，容易沾膠；開模時製品有機率黏上模，導致機械手臂無法夾取。
- **根本原因：**上模邊框接合處縫隙卡膠料，將整片製品黏附於上模。
- **解決方案：**模具邊框改造完成後，送電鍍處理——下模電鍍鉻，上模電鍍鎳，確保開模後製品穩定附著下模，上模不沾膠。亦可上下模均鍍鎳，關鍵是確保製品附著下模。

三、決議事項與行動事項

本次會議達成以下決議，請相關負責人依期限執行：

#	決議 / 行動事項	負責人	期限
1	蘇州一樓地板完工後，要求建商量測機械手臂區塊最高最低點落差與位置數據	蘇州毅豐	地板完工後即辦 (預計 7 月底後)
2	事先規劃全部設備入場順序與動線，避免先入場設備阻擋後續設備，設備進廠前完成確認	陳總 + 蘇州毅豐	設備入場前
3	確認防黏片長寬厚尺寸	黃國棟	已新增至本次會議記錄 附件一
5	在下模圖面標示填孔應避開區塊	黃國棟	已新增至本次會議記錄 附件二
6	模具邊框改造完成後送電鍍（下模鍍鉻、上模鍍鎳或上下模皆鍍鎳），確保製品穩定附著下模	蘇州毅豐（模具外加工）	模具改造完成後
7	本次會議進度報告於 5/9 中午前提交	余振中	5/9 中午前

四、備註

- 蘇州毅豐特助及呂課長以視訊方式出席。
- 陳總提醒：設備安裝前所有前置作業（地板平整度確認、基準線定位、入場順序規劃）務必事先完成，否則極易重演台灣案例延誤情況。

五、簽核

記錄	審核/核准
余振中	經理張君豪

附、現場照片與附件

【附件一】PP 板雙霧面 (訂購單)

毅豐橡膠工業股份有限公司

公司地址:高雄市岡山區岡山北路三號
TEL:07 6210469~74 FAX:07 6224129
統一編號:85710002

核准: 孫揚凱 承辦: 張君豪 申請人:
發單日期: 2025/06/20

訂購單

供應商名稱: 統立塑膠企業有限公司
供應商地址: 台中市大里區西湖路339號
訂單號碼: 3302 20250620002

供應商代號: M-09-011
供應商電話: 04-24962839
課稅別: 應稅外加

備註: 出料
供應商傳真: 04-24963079
交易幣別: NT\$
付款條件: 結帳後90天開票

項目	品名	規格	單價	數量	單位	金額	預交日
1	PP板雙霧面/圓角黃色	450*450mm*0.75mm	11	5,000	PCS	55,000	2025/06/30
2	以下空白						
3	黃色: 3B431						
4							
5							
6							

總金額 55,000

PS: 若無隨貨附檢驗報告造成敝公司無法完成驗貨程序, 因而延付貨款, 敝公司恕不負責

送貨地址: 高雄市岡山區岡山北路3號

1. 交貨單原料商品名與發票開立須一致, 單價/數量/總金額須與訂購單符合才能付款。

2. 數量雖符合時須與敝公司相關人員洽商同意後生效, 否則須自行負責多餘部份恕暫不付款。



3. 請隨貨附上發票/留存交貨單/成品出廠檢驗報告或(成份分析報告表)儲存條件如有特殊規定之注意事項, 必須詳細附帶說明。


4. 貴公司收到此訂單請簽章電傳或郵寄回覆, 未盡事宜請來電與敝公司相關人員洽商再確認。 謝謝合作

5. 貴公司同意在所送達的貨品中不含環境管理物質一覽表中各種物質, 及不使用來自剛果民主共和國沖突礦產。

C0705-03

【附件二】模具修改示意图

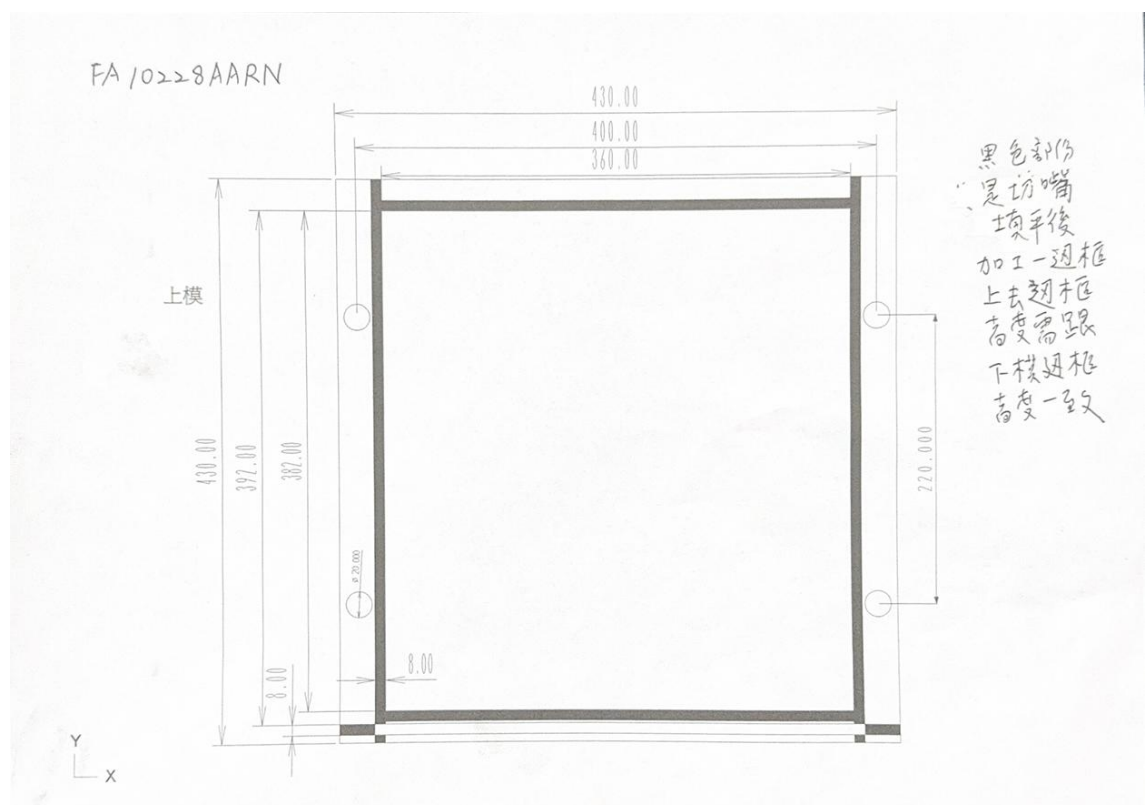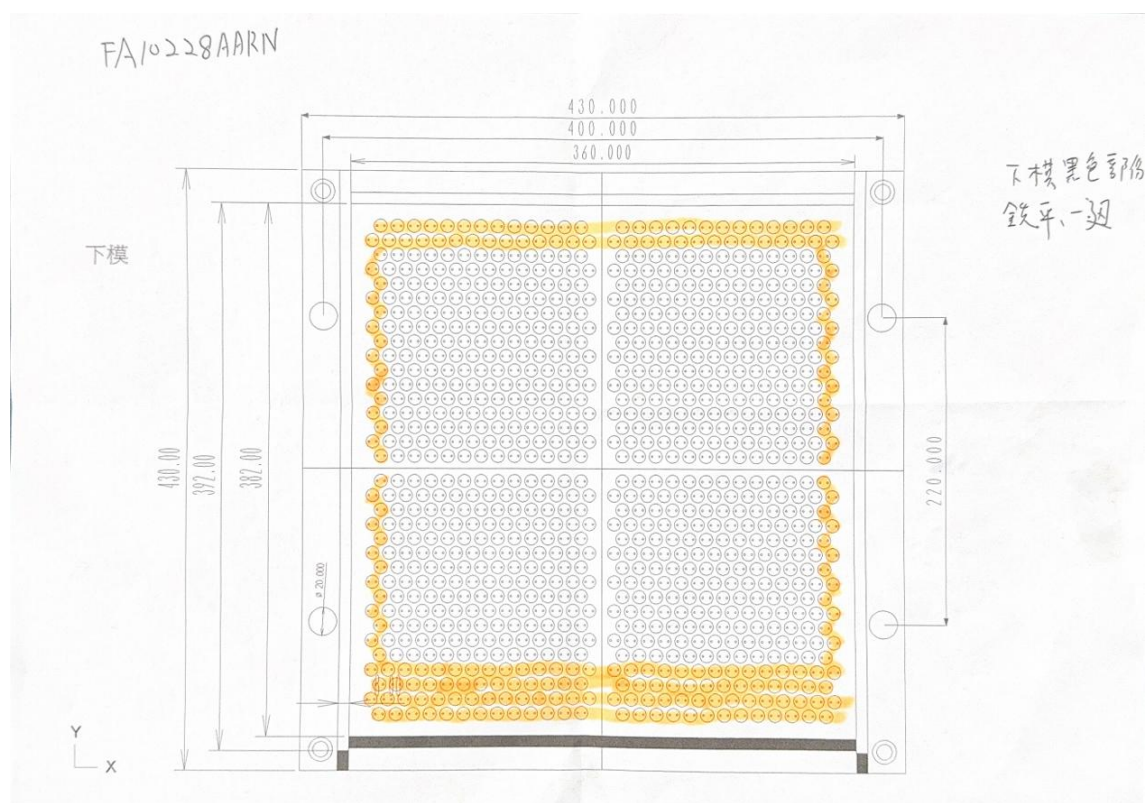

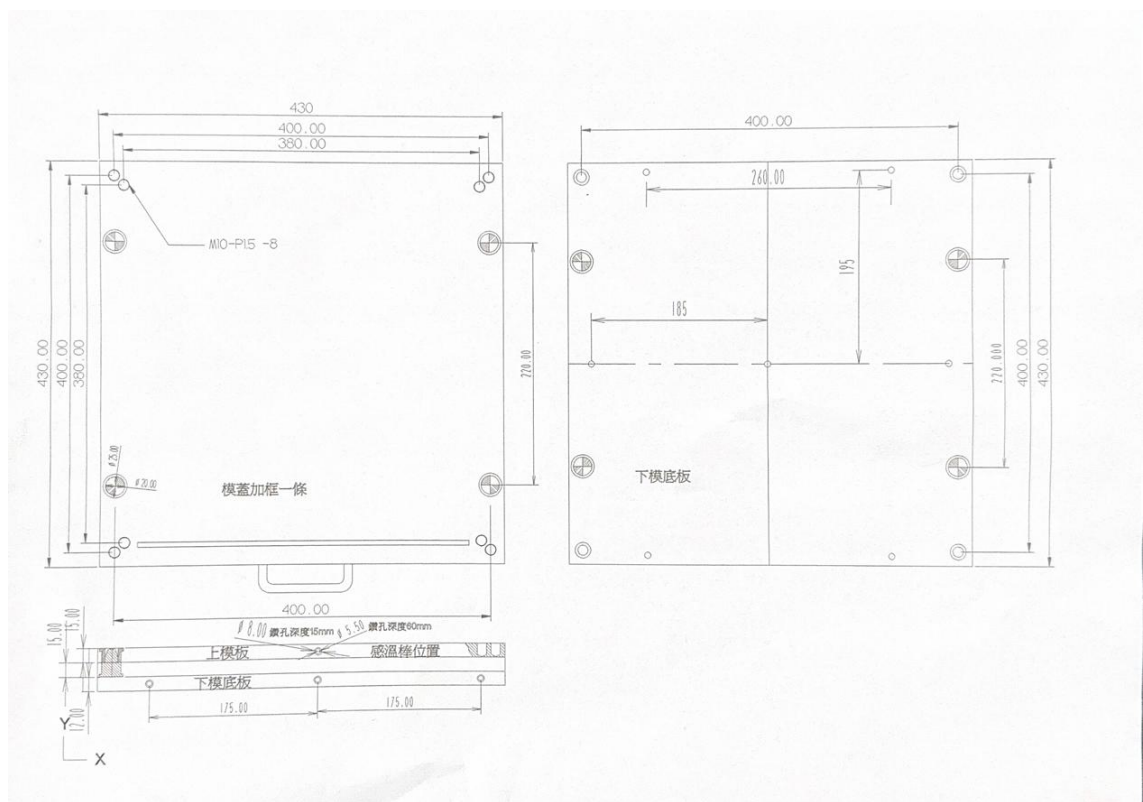

【附件三】機械手臂現場照片 (2026 / 05 / 08 起達目前組裝持續進行中)







磐石成型機

