會　議　記　錄

2025 年 12 月 23 日

會 議 名 稱	大陸蘇州毅豐自動化機台設備布局討論會議	時　間	10:30~12:00 13:00~14:20
會 議 主 席	張君豪經理	地　點	2F 會議室

出席人員：
毅豐：黃國棟、余振中(記錄人員)
起達：陳總

會議內容：

議題討論

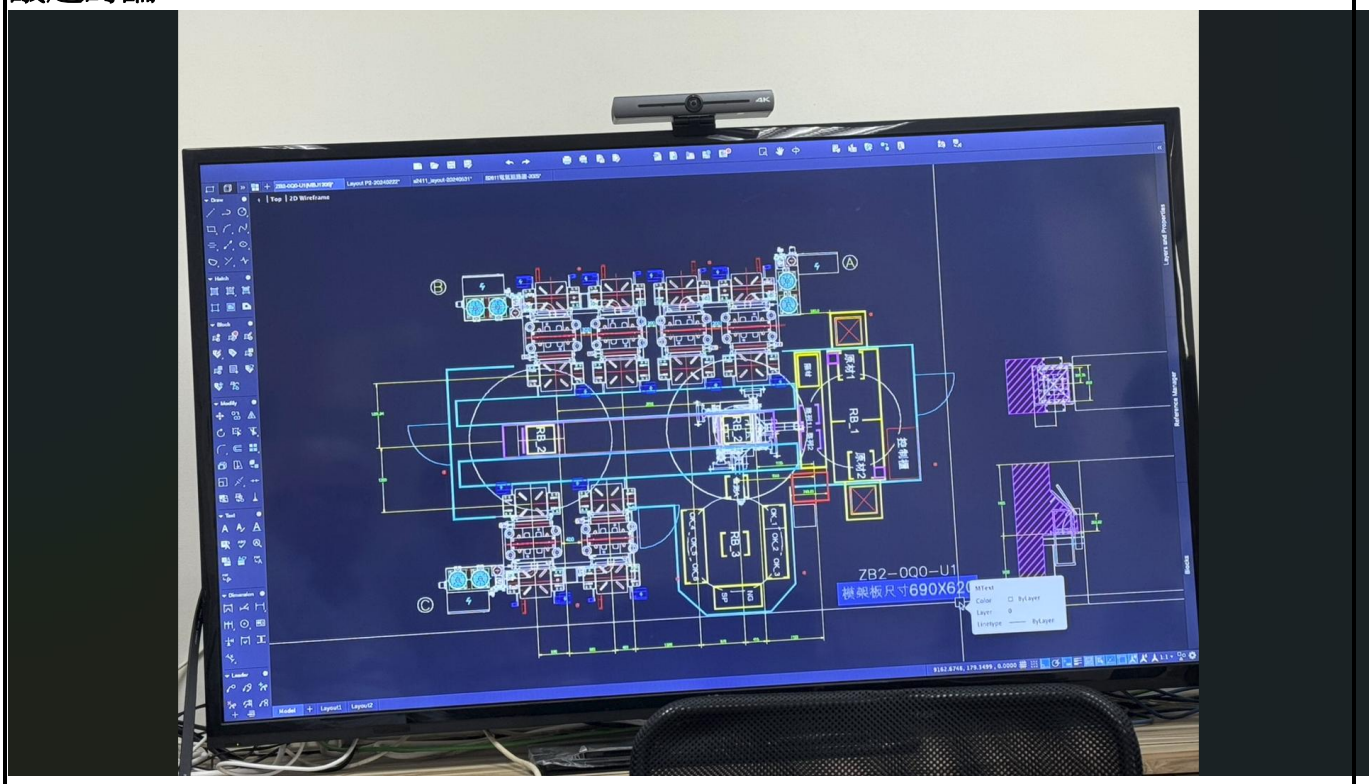

一、 供料系統設計：原材 **1**、原材 **2** 不停機補料

- 目前方案： 維持人工補料模式。
- 設計目標： 必須達成「不停機補料」之功能，確保生產連續性，避免因補料導致產線中斷。

二、 格材籃子推車設計與安全防護

- 工安考量： 為預防推車退出後，作業人員誤由入口進入機械手臂作業區，須增設相關安全連鎖或防護機制。
- 在地化採購： 後續籃子推車將由蘇州廠就地製作，規格須符合該入口的高度與寬度。

三、 控制櫃位置佈局方案評估

- 方案一 (不採用)： 放置於原材 **2** 與 **CCD** 之間。因空間過於侷促，將導致後續維修保養作業困難。
- 方案二 (最終決議)： 維持原設計位置但改變擺放方向。
  - 影響： 總長度雖增加 **40cm**。
  - 優點： 作業人員操作 **HMI** (人機介面) 時可同步監控機械手臂運作狀況，且保有充足的維護保養空間。

四、 關鍵備品規劃

- 項目： 夾爪用矽膠片。
- 行動建議： 由於該零件交期較長，雖更換頻率不高，而蘇州廠機械手臂也會使用，仍請起達先行添購備品，避免影響產能。

五、 廠內空間適應性

- 當前配置： 目前設備布局僅適用於 **C** 區機台。
- 異常說明： 廠內預設之 **A** 區與 **B** 區空間寬度不足，暫無法容納此配置。

六、 安全設施加裝

- 行動項目： 圍籬上的「緊急停止按鈕」屬必要安全裝置，請蘇州廠務必依規劃安裝上線。

七、 軟體功能優化：烘模作業暫停計時功能 (國棟提議)

- 現況問題： 目前若人員須中途進入維修，烘模計時會隨之歸零，導致製程時間不精確。
- 優化方案： 增加「暫停計時」功能。維修時暫停，結束後恢復計時，提升作業直覺性。
- 驗證計畫： 此功能將優先於蘇州廠機械手臂系統進行開發與測試驗證。

八、 **PLC** 網路連線 (**TCP**) 與數據位址設定 (振中提議)

1. 備份程序： 進行 **PLC** 內部 **TCP** 網路設置前，必須完整讀取並備份所有內部紀錄（含暫存區）。
2. 邏輯掌握： 數據位址之查找需深入了解程式梯形圖（**Ladder Diagram**）邏輯，後續需安排時間熟悉程式架構。

九、 設備水平調整校正

- 後續行動： 於下次與蘇州廠會議時，正式提出「水平校正設備」之工具與人力需求，確保機台安裝精度。

重點摘要： 本次會議針對蘇州廠設備布局、工安防護、備品規劃及 PLC 邏輯設定進行深度討論，並確立了部分硬體配置與軟體功能優化方向。
