會　議　記　錄

2026 年 1 月 15 日

會 議 名 稱	大陸蘇州毅豐自動化機台設備布局討論會議	時　間	10:00~12:00 13:00~14:00
會 議 主 席	張君豪經理	地　點	2F 會議室

出席人員：
起達：陳總
毅豐：黃國棟、余振中(記錄人員)

會議內容：

議題討論

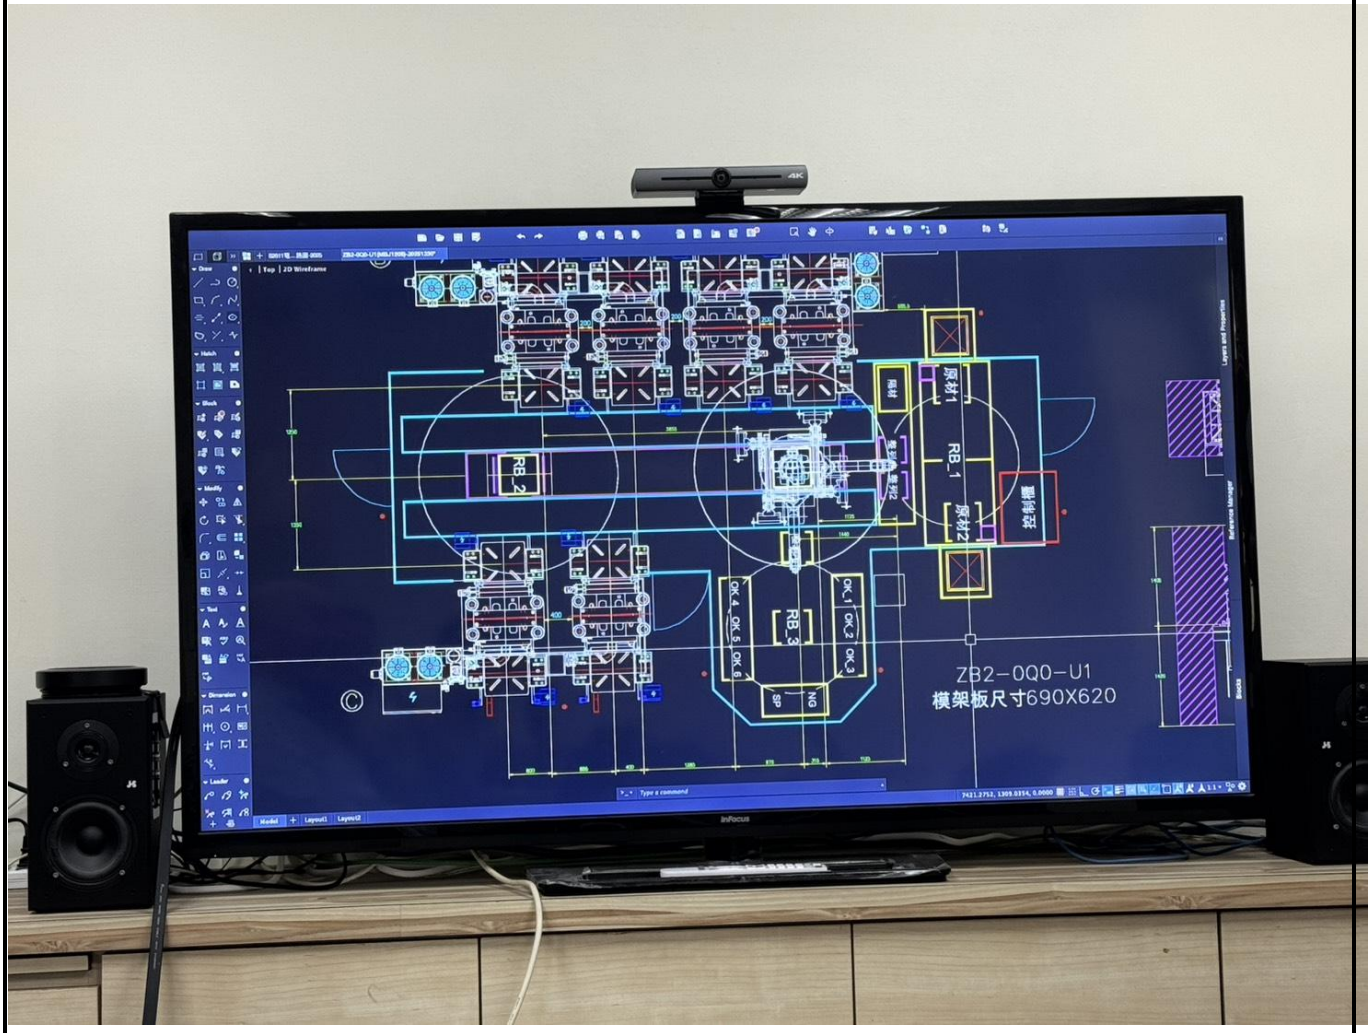

一、蘇州廠現場設備與設施準備事項
圍籬製作與安全設施：

- 依規劃圖之圍籬部分由蘇州廠安排製作。
- 有一個緊急停止開關需安裝在圍籬上(其餘安全裝置皆裝在起達與磐石設備上)。
- 現況說明：蘇州廠對目前佈局規劃圖尚未充分理解,須待現場設備實際擺設後

方可確認細節。

現場設備佈建規劃：

- 蘇州廠須於現場自行規劃以下設備之佈建位置：
  - 離型劑泵浦
  - 氣壓源
  - 真空源
- 台灣廠技術支援：
  - 提供圍籬設計方式與建議供參考。
  - 泵浦桶子與攪拌裝置規格資訊的提供。

二、網路管理系統建置需求

網路架構規劃：

- 需為設備建置獨立區域網路,並確保該區網能連接國際外網。
- 應用目的： 實現跨國遠端監控功能,可於世界各地隨時掌握設備運作狀態。
- 特殊考量： 大陸地區具外網連線限制,須特別規劃網路架構。

三、場內測試期間臨時防護措施

臨時圍籬需求：

- 測試期間需設置臨時圍籬,並確認須布建圍籬之區域範圍。
- 建議方案： 考量成本效益,採用短期租用圍籬方案即可。

四、設備規格與進廠時程

進廠時程：

- 設備預計於 **2026** 年 **3** 月底 進廠安裝。

機械手臂規格選定：

- 採用 **13** 公斤高性能版 機械手臂。
- 決策依據： 經濟版(**8-12** 公斤)無法保證耐用度,且無充足時間進行驗證測試。
- 未來評估： 台灣廠可考慮測試 **12** 公斤機型,但需考量同廠牌日製與大陸製產品之耐用度差異問題。

五、**RB1** 原材區補料方案調整

原設計方案：

- 底部滾輪設計,棧板手動退出至隔離平台進行更換。
- 設計原則為「不停機補料」,但並未定案是否為自動補料方案。

安全規範考量：

- 依循 **ISO** 規範,基於安全考量,作業中人員動作不可進入作業範圍內,須進行隔離。
- 需符合大陸當地法規,目前規劃採用硬體強制隔離。

最終決議(經與副總、經理討論後)：

- 移除多出的隔離平台,但需加入其他防護方案替代。
- 新增安全措施： 原材區預計加裝光柵防護裝置。

- 作用機制： 開啟原材區門時光柵啟動,並於 **RB1** 控制軟體內增設安全模組。

- 備註： 除非價差費用過大或光柵方案技術不可行,否則維持此更改方案。若有變動將於後續會議提出。

六、**RB3** 收料區感應器設備需求

設備供應責任：

- **RB3** 收料區開關門之感應器由蘇州廠自行準備,起達不提供。

需求規格：

- **RB3** 共有 **3** 個門,需準備 簡單進階開關 **× 3** 個。
- 行動項目： 台灣廠須提供目前現場使用之感應器裝置照片予蘇州廠參考。

七、原材區滾輪設計說明

設計考量：

- 基於未來自動補料之長期規劃,原材區維持滾輪設計不變(即使已移除隔離區)。
- 現況說明： 目前現場使用之萬向滾輪無法支援自動補料設計設計。

八、生產日誌資料位置確認(余振中提議)

詢問事項： 目前現場生產日誌之資料儲存位置。

起達回覆：

- 所有資料皆存放於電腦資料庫中。
- 與生管備份之生產紀錄位於不同資料夾。
- 後續行動： 會後已於現場設備實地確認並了解資料位置。

九、遠端畫面登入狀態說明(國棟提議)

詢問事項： 生管反映今日遠端畫面顯示為登入畫面之原因。

起達回覆：

- 遠端系統仍可透過密碼正常登入。
- 後續行動： 將提供登入密碼予生管人員使用。

十、加硫機設備定位水平精度標準討論(起達提議)

技術要求說明：

- 磐石須向起達明確說明加硫機設備之定位水平精度標準。
- 關鍵議題： 須確認以何種標準作為基準,以統一所有機台之水平校正標準。

技術原因：

- 起達機械手臂之作動進出皆以加硫機下加熱板位置為基準進行運作,水平精度將直接影響系統穩定性。

後續安排：

- 已排定 下週三(**1** 月 **21** 日)下午 **13:30**,磐石、起達至公司現場進行實地討論與確認。

重點摘要：

本次會議針對蘇州廠設備佈局、網路系統建置、安全防護方案及機械手臂規格進行深度討論。主要決議包括： **RB1** 原材區移除隔離平台但加裝光柵防護、確認採用 **13** 公斤高性能版機械手臂、設備預計 **3** 月底進廠,以及下週三安排磐石與起達至現場討論水平精度標準。
